

INFORME DE FACTURA. FIN DE OBRA.

Presupuestos Participativos 2018

Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

DATOS DE LA PROPUESTA DE REFERENCIA: TAMADITE: Mejorar la cancha y el parque de Roque Negro . MOBILIARIO*


*Fuente: <https://www.santacruzdetenerife.es/paticipa/>

- **Nº de propuesta:** 709 B
- **Ubicación:** Diseminado Roque Negro 46, junto a CEIP Sor Florentina y Agustín Cabrera Díaz
- **Ámbito de actuación:** Otras
- **Georreferencia:** 28 R 378014.50 m E 3158014.32 m N
- **Distrito:** Distrito Anaga
- **Estado:** EJECUTADO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

Banco:



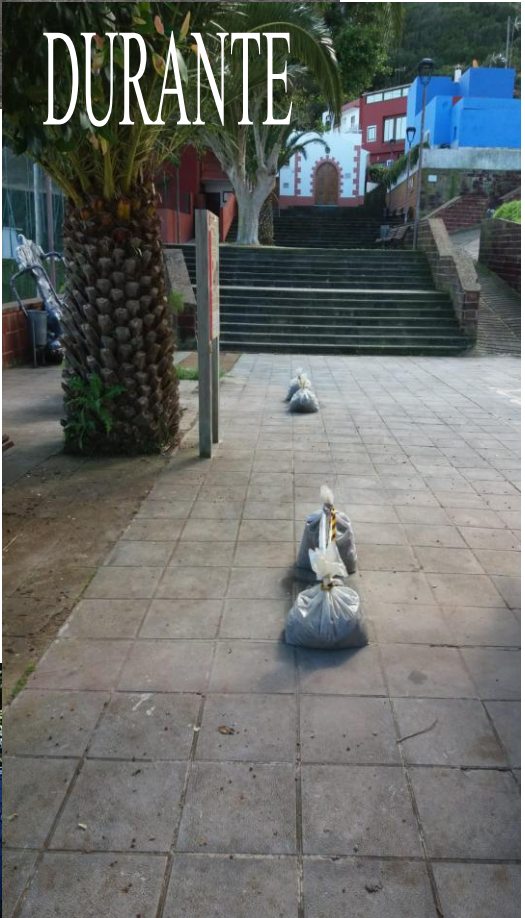

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

- **Fecha de inicio de trabajos:** 22/11/2018
- **Fecha de fin:** 30/11/2018
- **Plazo:** ejecución dentro del plazo límite permitido.
- **Descripción de los trabajos ejecutados:** Se instala un banco igual junto al banco existente y de similares características en zona acondicionada para banquillo en Cancha de Roque Negro. Se instalan 2 elementos biosaludables coincidentes con modelos presupuestados en zona de la Plaza acordada con los agentes participantes del barrio (Ditrío y Asociación de Vecinos). Ejecución conforme a la normativa existente y guardando las distancias de seguridad exigidas por las fichas técnicas de los elementos.

DATOS DE PRESUPUESTO Y FACTURA:

- **Empresa:** ACCIONA CONSTRUCCION
- **Nº de Presupuesto:** ACCIONA: Expdte. 709 y Expdte. 709 M
- **Importe de presupuesto:** 2.891,60€
- **Nº de expediente:** 332/2018/PC
- **Fecha de conformidad:** 23/07/18
- **Nº de factura:** B7071FR 00014
- **Importe de factura:** 2.891,58€
- **Justificación:** Se han realizado los trabajos solicitados conforme a las instrucciones dadas y a los presupuestos adjudicados, existe una diferencia de -0,02€ entre el presupuesto y la factura que se debe a ajustes decimales en las cantidades de la factura electrónica.

Vista la solicitud del servicio de igualdad, Participación Ciudadana y Soporte administrativo de Distritos, a los efectos de que se informe si la factura presentada es conforme con los trabajos encargados y el presupuesto conformado, se informa que es correcta según los datos expuestos en este informe.

Firma,

M^a Vanesa Ramallo Herrera.
Coordinadora de obras.
Presupuestos Participativos 2018.

