

INFORME DE FACTURA. FIN DE OBRA.

Presupuestos Participativos 2018

Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.


DATOS DE LA PROPUESTA DE REFERENCIA: Biosaludables en Valleseco*

*Fuente: <https://www.santacruzdetenerife.es/paticipa/>

- **Nº de propuesta:** 556
- **Ubicación:** Calle El Rebolado (zona de ensanche de acera con árboles y bancos)
- **Ámbito de actuación:** Instalación de biosaludables
- **Georreferencia:** 28 R 378765.51 m E 3151996.68 m N
- **Distrito:** Distrito Anaga
- **Estado:** EJECUTADO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

CALLE EL REBOLADO

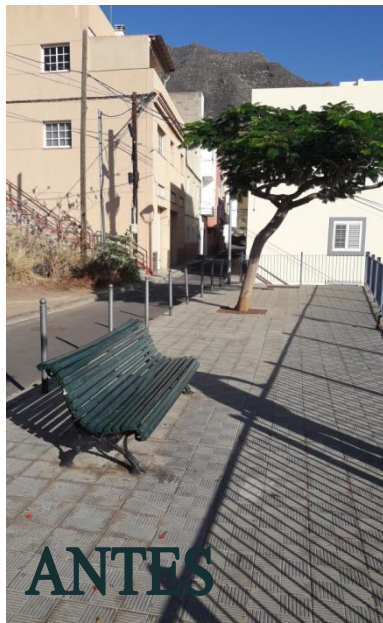

CALLE SAN SILVESTRE

2



EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

- **Fecha de inicio de trabajos:** 03/10/2018
- **Fecha de fin:** 09/10/2018
- **Plazo:** ejecución dentro del plazo límite permitido.
- **Descripción de los trabajos ejecutados:** Se colocan 2 elementos biosaludables al final de la Calle El Rebolado dada las medidas que indica el fabricante en relación a la no interferencia de objetos en un radio de seguridad de 1,5ml en circunferencia libre respecto del elemento. Por tanto se propuso a los agentes participantes la ubicación de los 3 módulos restantes en otra zona cercana, colocándose finalmente en la Plaza ... tal como se muestra en las fotografías y se adjunta en el Certificado de instalación emitido por Ases XXI.



DATOS DE PRESUPUESTO Y FACTURA:



- **Empresa:** BENITO URBAN SL

- **Nº de Presupuesto:** 0411/2018
- **Importe de presupuesto:** 3.846,65€

- **Nº de expediente:** 347/2018/PC
- **Fecha de conformidad:** 10/08/2018

- **Nº de factura:** 310011728
- **Importe de factura:** 3.846,65 €

- **Justificación:** Se han realizado los trabajos solicitados conforme a las instrucciones dadas y al presupuesto, añadiendo un cambio de ubicación circunstancial de 3 elementos sin variar el presupuesto de adjudicación.

Vista la solicitud del servicio de igualdad, Participación Ciudadana y Soporte administrativo de Distritos, a los efectos de que se informe si la factura presentada es conforme con los trabajos encargados y el presupuesto conformado, se informa que es correcta según los datos expuestos en este informe.

Firma,

M^a Vanesa Ramallo Herrera.
Coordinadora de obras.
Presupuestos Participativos 2018.

