

# INFORME DE FACTURA. FIN DE OBRA.

*Presupuestos Participativos 2018*

*Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.*

## DATOS DE LA PROPUESTA DE REFERENCIA: Parque de perros en el Parque Don Quijote\*

\*Fuente: <https://www.santacruzdetenerife.es/paticipa/>

- **Nº de propuesta:** 351
- **Ubicación:** Parque Don Quijote, linda con calle Pepita Serrador
- **Ámbito de actuación:** Equipamientos para parques de perros
- **Georreferencia:** 28 R 376841.71 m E 3148815.38 m N
- **Distrito:** Distrito Salud-La Salle
- **Estado:** EJECUTADO

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

ANTES:





# ANTES






# DURANTE

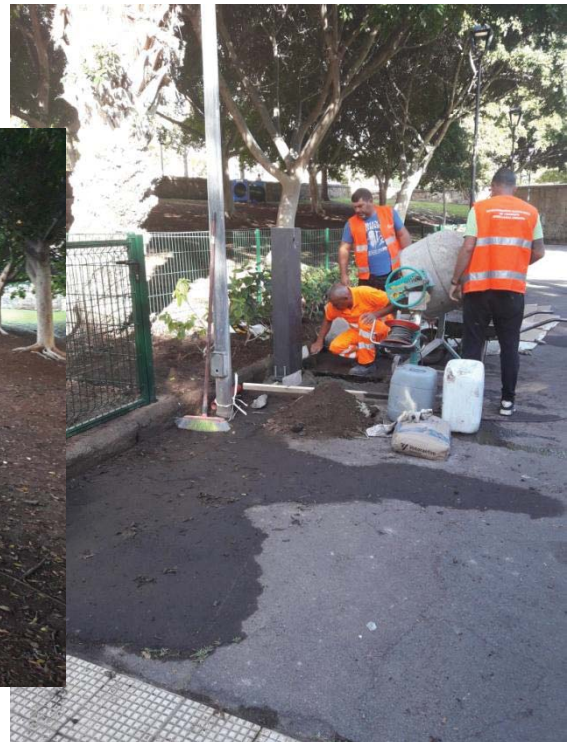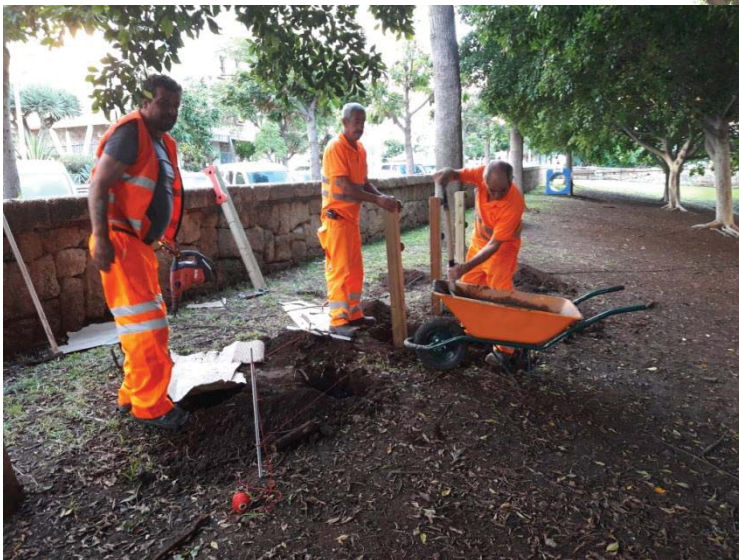



**DESPUÉS**



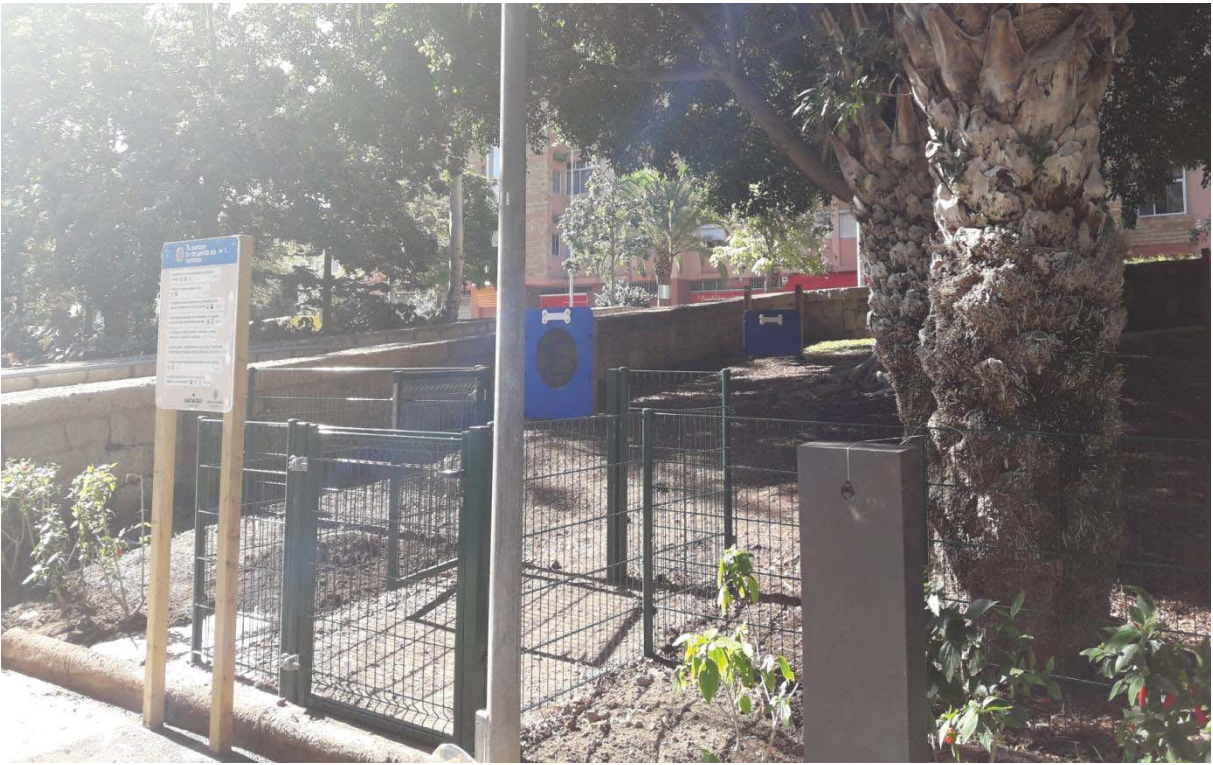



Acometida y arqueta en acera realizada para la fuente de agua:



## EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

- **Fecha de inicio de trabajos:** 1/11/2018
- **Fecha de fin** ejecución dentro del plazo límite permitido.
- **Descripción de los trabajos ejecutados:** Parque de perros en zona actualmente destinada a jardín, dentro del parque Don Quijote acordada con el Servicio de Parques y jardines. Parque compuesto por doble puerta de entrada, vallado de 1 ml de alto con postes de cimentación en dado de hormigón, bebedero conectado a red de agua potable, 2 bancos, incluso 4 unidades de columpios para mascotas, con cimentación y perfectamente terminados.

## DATOS DE PRESUPUESTO Y FACTURA:

- **Empresa:** ACCIONA CONSTRUCCIÓN
  - **Nº de Presupuesto:** REF: P. Canino. Don Quijote
  - **Importe de presupuesto:** 9.702,72€
  - **Nº de expediente:** 417/2018/PC
  - **Fecha de conformidad:** 08/08/18
  - **Nº de factura:** B7071FR 00011
  - **Importe de factura:** 10.188,93€
- 
- **Justificación:** Se han realizado los trabajos solicitados conforme a las instrucciones dadas y al presupuesto modificado nada más iniciarse el expediente en que se detallaba el cambio de presupuesto para excluir la papelería (que será aportada por Servicios Públicos) y se cambia el modelo de bancos por unos de mayor longitud, pasando de bancos-silla a bancos dobles de 1,80ml de largo, a continuación se copian los datos aportados en dicha modificación:

## DATOS DEL PRESUPUESTO MODIFICADO PROPUESTO:

- **Nº o título de Presupuesto:** REF. P. Canino Don Quijote
- **Fecha:** 7/16/18
- **Empresa:** ACCIONA CONSTRUCCIÓN
- **Importe:** 10.188,93€
- **Plazo de ejecución:** 15 semanas
- **Justificación:** Tras reunión con el departamento de Servicios Públicos (Mobiliario Urbano), se acuerda que: 1) Servicios Públicos va a asumir el suministro e instalación de las 2 papelerías que se van a colocar en el parque de perros. 2) Se estima conveniente colocar dos bancos de una longitud mayor, pasando de bancos-silla Neobarcano de 0,70ml de longitud de asiento, a dos bancos Neobarcano de 1,80ml de asiento, incrementándose el presupuesto, con transporte e impuestos incluidos en 486,21€. Pasando de 9.702,72€ en el informe de presupuesto a 10.188,93€ del informe de modificación actual.

Vista la solicitud del servicio de igualdad, Participación Ciudadana y Soporte administrativo de Distritos, a los efectos de que se informe si la factura presentada es conforme con los trabajos encargados y el presupuesto conformado, se informa que es correcta según los datos expuestos en este informe.

Firma,



---

**M<sup>a</sup> Vanesa Ramallo Herrera.**  
Coordinadora de obras.  
Presupuestos Participativos 2018.

