

# INFORME DE FACTURA. FIN DE OBRA.

*Presupuestos Participativos 2018*


*Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.*

## DATOS DE LA PROPUESTA DE REFERENCIA: Alumbrado en Plaza Duggi\*




\*Fuente: <https://www.santacruzdetenerife.es/paticipa/>

- **Nº de propuesta:** 458
- **Ubicación:** Plaza Duggi, en Calle Duggi
- **Ámbito de actuación:** Alumbrado
- **Georreferencia:** 28 R 376673.16 m E  
3149481.92 m N
- **Distrito:** Distrito Centro-Ifara
- **Estado:** EJECUTADO

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:



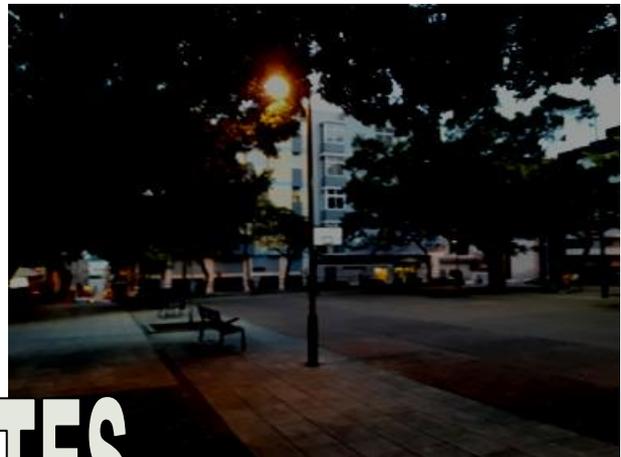


ANTES

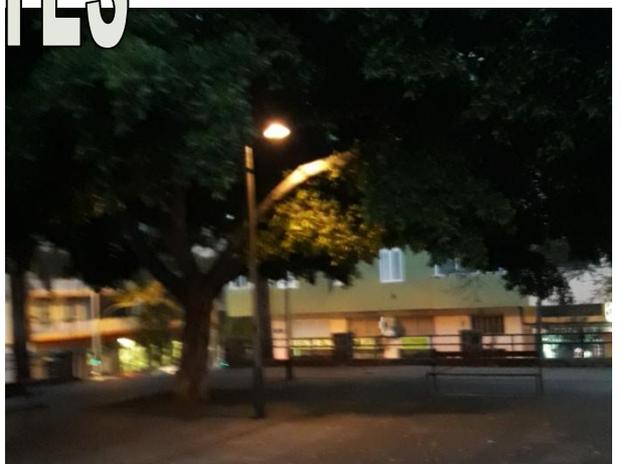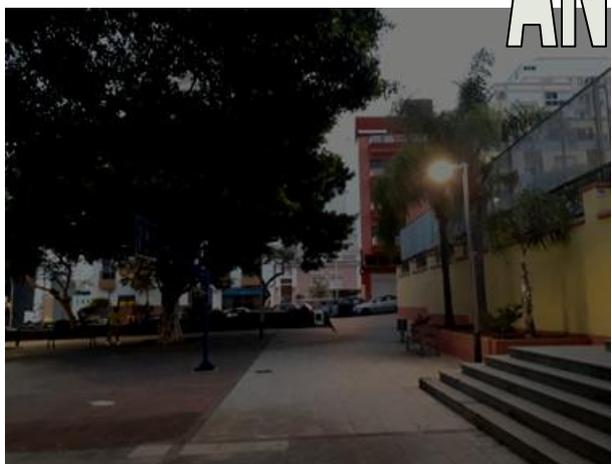



DESPUÉS

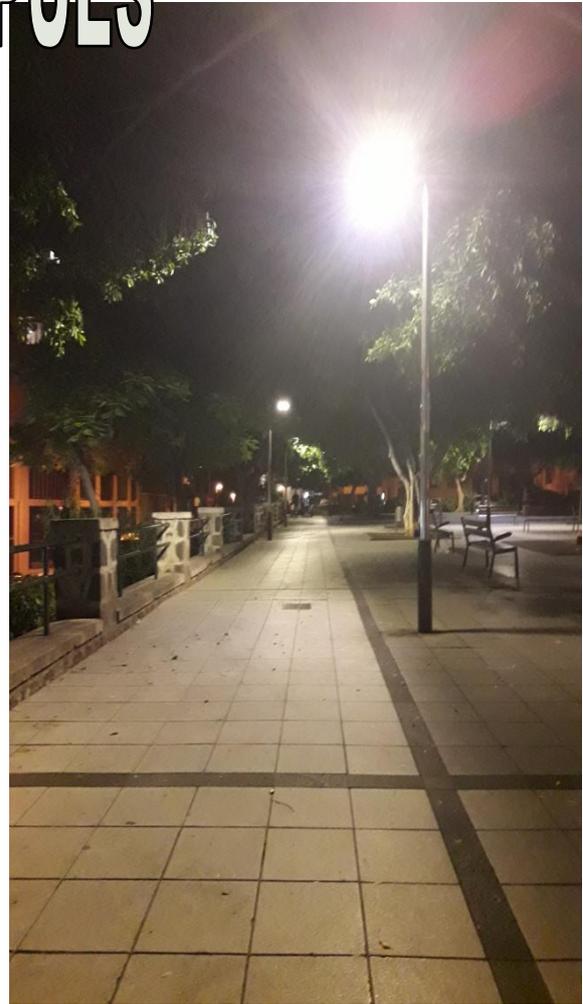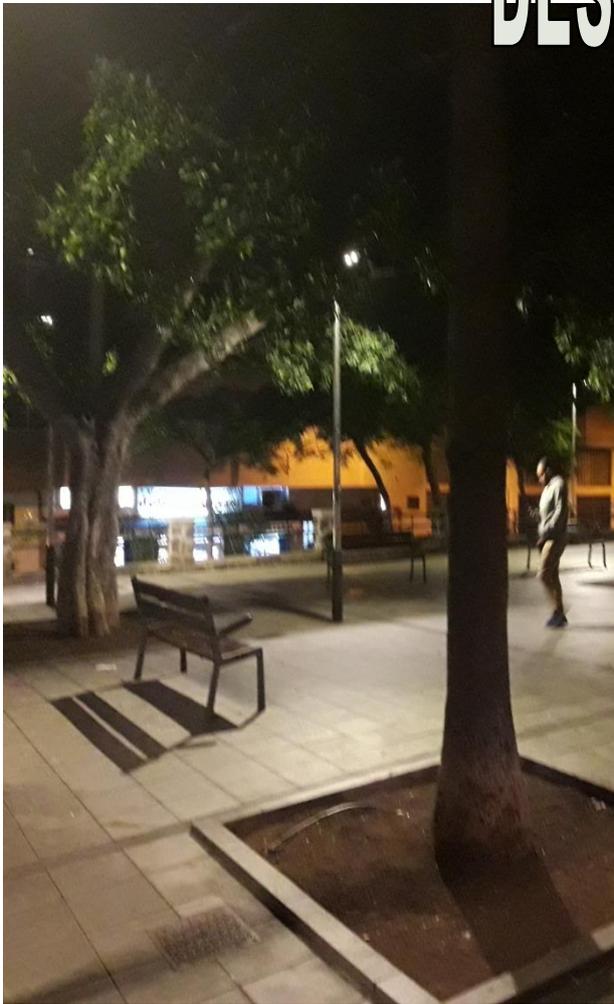


## EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

- **Fecha de inicio de trabajos:** 29/11/2018
- **Fecha de fin:** 30/11/2018
- **Plazo:** ejecución dentro del plazo límite permitido.
  
- **Descripción de los trabajos ejecutados:** Se cambian 16 LUMINARIAS modelo FLEXITY, IP66, CI, óptica para calle, en aluminio inyectado, led 40W, 500mA, 4000 K, 4000 lm, D=60mm y 2 proyectores THORN LIGHTING, modelo LEDFIT S 45W A/S CL1 L740, IP66, IK 07 o equivalente, en aluminio inyectado, led 45W, 4000 K, 4500 lm, además se colocan 3 PROYECTORES TIPO proyector asimétrico del fabricante THORN LIGHTING, modelo LEDFIT S 45W A/S CL1 L740, IP66, IK 07 o equivalente, en aluminio inyectado, led 45W, 4000 K, 4500 lm. Incluido canalización, arquetas, cableado, conexionado, y remate de pavimento y arquetas. Todo terminado y funcionando.

## DATOS DE PRESUPUESTO Y FACTURA:

- **Empresa:** IMES-API
  
- **Nº de Presupuesto:** 059.18.BIS
- **Importe de presupuesto:** 15.231,90€
  
- **Nº de expediente:** 335/2018/PC
- **Fecha de conformidad:** 07/09/18
  
- **Nº de factura:** FVTA382 382N180175
- **Importe de factura:** 9.909,23€
  
- **Justificación:** Se ha realizado los trabajos objeto de esta propuesta que eran la “Mejora del alumbrado en Plaza Duggi”, de forma que la solución tomada fue cambiar el modelo de luminaria propuesto inicialmente que no era orientable y por tanto había presupuestado el cambio de posición de nueve puntos de luz para distribuir de otra forma la iluminación de la Plaza dado el volumen de la vegetación. El cambio de la luminaria presupuestada sirvió para colocar un modelo orientable tanto en altura como en posición para evitar la obra civil que suponía, intentando conseguir el mismo resultado con una modelo diferente de iluminación led orientable. Por tanto se suministran y montan 16 luminarias del fabricante AEC ILLUMINAZIONE, modelo ECORAYS BR, IP66, CI, en aluminio inyectado, led 42W, 3000 K, 4150 lm, con equipo electrónico regulable Dali, D=60mm color grafito y brazo mod. MBC 1.02, de diámetro 102 o 127 mm. Al montarlas quedan varias zonas oscuras cercanas a la cancha que se solucionan con la colocación de 3 uds de proyector asimétrico del fabricante THORN LIGHTING, modelo LEDFIT S 45W A/S CL1 L740, IP66, IK 07 o equivalente, en aluminio inyectado, led 45W, 4000 K, 4500 lm. Con el desmontaje de las luminarias



anteriores, el conexionado y herraje de los proyectores y el pintado de los soportes para conseguir la uniformidad perdida en la zona. Ahorrándose del presupuesto la parte de nueva canalización que suponía mover los puntos de luz, ahorrando el cableado, la línea subterránea, las zanjas de excavación, el tapado, las picas, y las nuevas cimentaciones si se hubieran movido los 9 báculos. Con un ahorro total sumado de 5.322,67€. Pasando de un presupuesto de 15.231,90€ a una factura a pagar de 9.909,23 €, que coincide con las unidades de obra y los trabajos realizados.



Vista la solicitud del servicio de igualdad, Participación Ciudadana y Soporte administrativo de Distritos, a los efectos de que se informe si la factura presentada es conforme con los trabajos encargados y el presupuesto conformado, se informa que es correcta según los datos expuestos en este informe.

Firma,

---

**M<sup>a</sup> Vanesa Ramallo Herrera.**  
Coordinadora de obras.  
Presupuestos Participativos 2018.

